

## Viikkotiedote VK 16 / 2024

---

### Stadin ammatti- ja aikuisopisto Roihupellon kampus, Holkkitie 5, 00880 HELSINKI

**Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammatti- ja aikuisopisto Roihupellon kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000 bruttom2 jättikampus on Lujatalon historian suurin hanke.**

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Itä-Helsingin Roihupeltoon. Uusi oppilaitos tulee korvaamaan sekä kokoamaan yhteen saman katon alle tällä hetkellä eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3000 läsnä olevalle opiskelijalle. Kokonaismäärältään opiskelijoita on noin 4500, joista noin kaksi kolmasosaa on jatkuvasti paikalla. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 brm2, josta hyötyalaa on noin 30 000 hym2. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden toteuttamisesta, sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä

Työt kohteessa on aloitettu 1.5.2022 vanhan rakennuskannan purkutöillä. Hankkeella on voimassa oleva purkulupa 45-2084-21-P, maisematyölausunto 45-2107-22-MLA, sekä rakennuslupa LP-091-2022-03551.

Rakennushankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuussa 2025



16.4.2024; Julkisivu itään, Holkkitielle päin.

---

**Käynnissä olevat työvaiheet**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>A-lohkolla</b> | 2. -4. krs levyväliseinätyöt<br>2 - 3. krs etuputsityöt<br>1 - 2. krs tasoite- ja maalaustyöt<br>Talotekniikka asennukset<br>Palokatkotyöt ja -kittaukset<br>1 - 2. krs Laatoitustyöt<br>1. krs Huonetilojen pintamaalaukset<br>Corten- julkisivu asennukset                  |
| <b>B-lohkolla</b> | Ulkolasiseinien runkojen asennus ja lasitus<br>1 – 4. krs levyväliseinätyöt<br>1 - 2. krs tasoite- ja maalaustyöt<br>Palokatkotyöt ja -kittaukset<br>Talotekniikka asennukset<br>IVKH lattiapinnoitukset<br>Julkisivusaumaukset   |
| <b>C-lohkolla</b> | Väliseinämuuraukset<br>1 - 2. krs levyväliseinätyöt<br>Pölynsidontamaalaukset<br>Ulkolasiseinien asennustyöt<br>Talotekniikka asennukset<br>Vesikattotyöt<br>2. krs tekniikkakuilujen levytys<br>2 – 3. krs Pintalattiatyöt<br>Kellari massalattiatyöt<br>Julkisivusaumaukset |
| <b>D-lohkolla</b> | Lastauslaiturin sekä alapohjan raudoitus- ja valutyöt<br>Vesikattotyöt<br>Lattioiden hionnat<br>Talotekniikka asennukset  |
| <b>Piha</b>       | Sähköputkitukset<br>Valaisinjalustojen sähköputkitukset<br>Perusmaan tasaus<br>Ulkopuolisten viemäreiden asennukset   |

**Alkavat työvaiheet**

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
| <b>Vko 16</b> | <b>A</b> | 1. krs Huonetilojen pintamaalaukset<br>Corten- julkisivu asennukset |
| <b>Vko 17</b> |          | Sisäänkäyntikatosten perustukset                                    |
| <b>Vko 18</b> |          | Lastauslaiturin teräskatoksen runko                                 |
| <b>Vko 20</b> |          | Piharakennuksen purku<br>Keittiön massalattiat                      |
| <b>Vko 23</b> | <b>C</b> | Hissin 3 asennus  |
|               | <b>C</b> | Hissin 4 asennus  |



Kuvia työmaalta 16.4.2024





**Työmaan aluesuunnitelma (päivitetty 9.2.2024)**

**TYÖMAAN ALUESUUNNITELMA**

Stadin ammattipisto Roihupelto / Työnro 12532

Holkkitie 5, 00880 Helsinki


Lujatalo Oy

Laatinut: 26.8.2022 Jari Laulajainen, p. 044 585 2072

Päivitetty: 09.02.2024 Ina Kämppi

Työvaiheet:

- Maanrakennus-, vesikatto- ja sisävalmistusvaiheentyöt

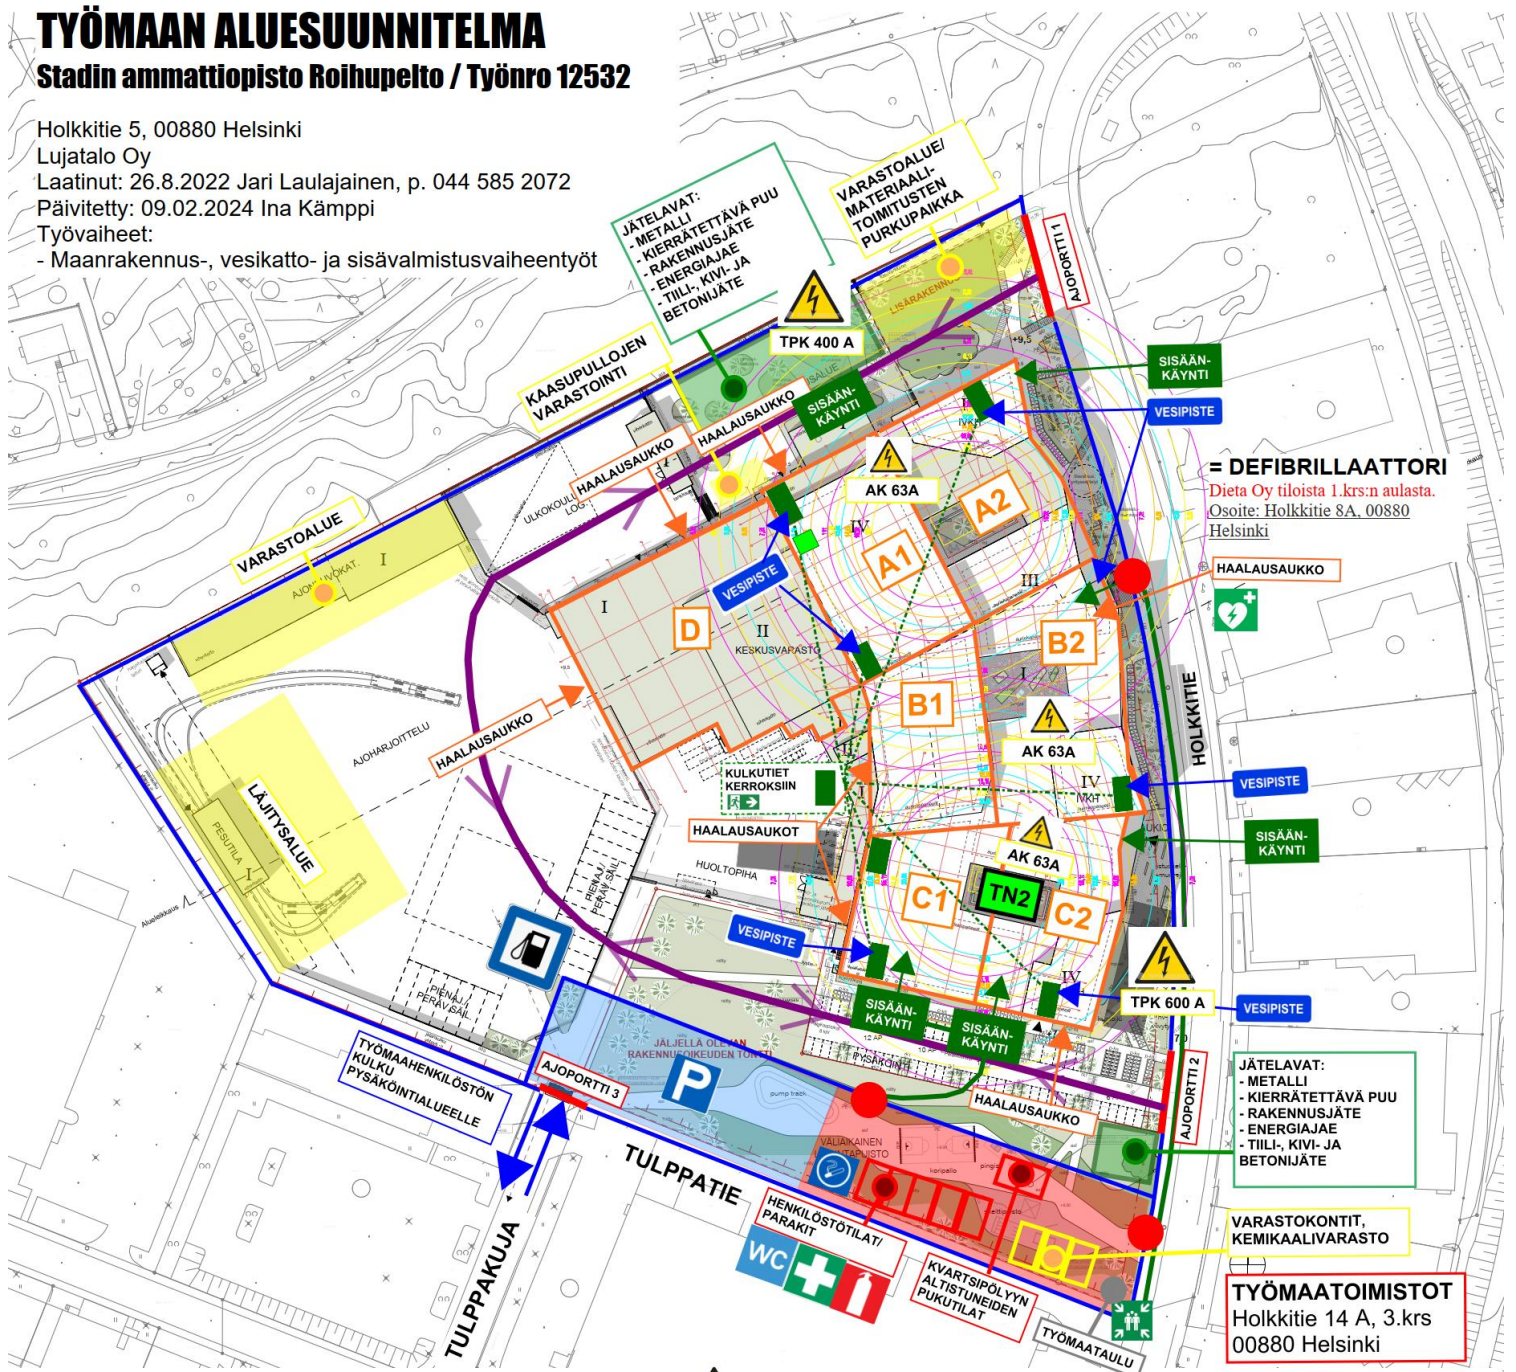

**= DEFIBRILLAATTORI**  
Dieta Oy tiloista 1.krs:n aulasta.  
Osoite: Holkkitie 8A, 00880 Helsinki

**TYÖMAATOIMISTO**  
Holkkitie 14 A, 3.krs  
00880 Helsinki

- P** = TYÖMAAHENKILÖSTÖN PYSÄKÖINTIALUE
- 🚒** = ALKUSAMMUTUSKALUSTO
- +** = EA-TARVIKKEET
- WC** = WC:t
- 👥** = KOKOONTUMISPAIKKA
- 🚬** = TUPAKKAPAIKKA
- 🛢️** = POLTTOAINEIDEN SÄILYTYS JA TANKKAUS ASFALTOIDULLA ALUEELLA

- ⚡** = SÄHKÖPÄÄKESKUS/ ALAKESKUS 400 A / 600 A; AK 63 A
- = TYÖMAA-AITA
- = AJOPORTTI (1, 2, 3)
- = LOHKOJAKO (A, B, C, D)
- = TYÖMAALIKENNE
- = KULKUTIE
- 🚰** = VESIPISTE
- = PYÖRÖPORTTI/KULUNVALVONTA

- 🟡** = VARASTOALUE / LÄJITYS / PURKU
- 🟢** = TAVARAHISSI → EI HENKILÖLIKENNETTÄ
- 🔴** = HENKILÖSTÖTILAT/ VARASTOKONTIT
- 🟠** = NOSTOPIAKKA/ BETONIN PUMPPAUS ALUE
- 🟩** = JÄTELAVAT
- 🚑** = DEFIBRILLAATTORI  
Dieta Oy tiloista 1.krs:n aulasta.  
Osoite: Holkkitie 8A, 00880 Helsinki

## Työmaan yhteyshenkilöt

### Vastaava työnjohtaja

Jari Laulajainen

### Tuotannosta vastaava

Työpäällikkö;  
Tomi Varonen  
[tomi.varonen@luja.fi](mailto:tomi.varonen@luja.fi)  
044 585 2943

## Videomateriaali

Kohteesta kuvataan videomateriaalia dronella, säävarauksella.

Viimeisin video on kuvattu **13.3.2024**

Tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta:

osoite: [YouTube, STAO Roihupelto](https://www.youtube.com/watch?v=Rzh7Emia9v0) (<https://www.youtube.com/watch?v=Rzh7Emia9v0>)

## Työmaan turvallisuus

- **12.4.2024** työmaalla on pidetty TR-mittaus (Rakennustyömaan turvallisuusmittaus).
  - **Viikon 15** mittaustulos on ollut **98,38 %**
- Työmaalla on työskennelty 18.4.2024, **50 työpäivää** ilman tapaturmia
- Työmaan vahvuus; viikolla 15 on ollut kaikkiaan 275 henkilöä
  - päivälle (ke) keskimäärin 190 työntekijää
- Seuraava viikkotiedote jaetaan viimeistään **26.4.2024**

Aurinkoisin terveisin;

*Marjut Auranen*

Projektiassistentti  
Lujatalo Oy  
[marjut.auranen@luja.fi](mailto:marjut.auranen@luja.fi)
